SARL TONEK

207 RUE DE HENRI TOULOUSE LAUTREC
45470 LOURY
France

Tél : 02 38 21 71 22
contact@boiskiteco.fr

Devis n° DEV-2022-0029

Valable 1 mois

En date du 15/06/2022

*Maison **Écologique** en Ossature **Bois** "**BoisKitEco**" ENERGO BBC PASSIVE*

N°	Désignation	Qté	PU HT	TVA	Total HT
1	Maison en ossature bois, kit pour le modèle " MINI 1 MODERN ", plans : bureau d'architecture ARCHIPELAG, système : à emboîtement "boiskiteco", dossier permis de construire déposé (en cours), surface 100m2, 3 chambres, dim. 12,34x11,24m.	1 ENS	38 500,00 €	20 %	38 500,00 €

N°	Désignation	Qté	PU HT	TVA	Total HT
	*Note globale *: Fourniture "maison en kit" : ***Murs : 415 mm (isolations 350 mm)** *Murs porteurs : 180 mm (isolation phonique 50 mm) *Cloisons : 125 mm (isolations 50-100 mm) – Lisse basse 50 x 150 mm (45x145) "**classe ST-II / C 24**" – Lisse basse 50 x 100 mm (45x95) – Lisse haute de ceinturage 2x 50 x 150 mm – Montants murs 50 x 150 mm (45x145) – Montants mur porteur 50 x 150 mm + OSB (45x145) – Montants cloisons 50 x 100 mm (45x145) – Solives 45/80/100 x 160-245 mm – Charpentes 45/60/80 x 160-200 mm – Entrait de charpente 45/60/80 x 160 mm – Linteaux 3x 45/50 x 145/150 mm – Poutres 145/150 x 145/150 mm / 150/200 x 240/320 mm – Tasseaux de clouage bardage 34 x 48 mm – Tasseaux, support BA 13 34 x 48 mm – Bardage extérieur bois massif 20 x 135 mm – Support isolation renforcée, faux plafond, platines métalliques 125 MM – Contreventement en OSB 12 119,6x2800 – Pointes, Vis, Connecteurs ENS – Grillage anti-rongeurs – Bandes adhésives et primaire bitumé ou colle – Liteaux 39 CM 104U 2X5 – Membrane, coupe-vente (murs et toiture) rouleaux 75 m2 – Film de pare-vapeur 200 microns = 0.2 mm (murs et plafonds) – Polystyrène graphité, termo organika 15 cm (façade, isolation par l'extérieur, plaques 50 x 100 cm – Polystyrène graphité, termo organika 2 cm (finitions) 1B / 3 cm 1B / 5 cm – Mousse pour coller les plaques (façade) – Chevilles + vis, pour fixer les plaques – Rondelles PVC – Corniers avec les treillis (façade) 75ML - Treillis en fibres de verre – Rail de départ 15/20 cm (façade) 40ML – Colle pour les treillis (sacs 25 kg) – Enduit acrylique thermo organika (seaux / 25 kg, couleur au choix) – Sous-couche (façade) – Peinture ou lasure (bois extérieur) – Silicone, acrylique, joints (ENS) – Notice, guide de pose, plans, vues en 3D				
2	Fenêtres : (fourniture) anthracite EXT.	1 ENS	5 200,00 €	20 %	5 200,00 €

N°	Désignation	Qté	PU HT	TVA	Total HT
	"PACK Fenêtres" Fenêtres PVC/Acier (option ALU 1F), U=0,71-91 THERMO LUX / Vitrage 4/18SS/4/18SS/4 U=0,5 PVC avec le profil métallique intégrée 6 chambres et 3 joints, profil 85 mm (surface RE 2020) *couleur Aluplast ext. blanc int.* baies vitrées coulissantes PSK et Smart-Slide note : nombres et modèles "dossier permis de construire" - 10u Smart-Slide 300x220*1 / PSK 240X220*1 / PF 105x220*2 / FIX 165x125*2 / OB 53,5x125*2 / OB 60x125*2 A 8,5x125*2				
3	Volets : (fourniture) anthracite	1 ENS	2 350,00 €	20 %	2 350,00 €
	"PACK Volets" Volets isolés 39-45 mm, motorisées (10u) et à sangle (0u) Moteur PORTOS 40/10 (S-40/10) 1-5 zones Coffret invisible "façade" (spéciale maison BBC / RT2012 / RT2020) Centrale simply domotique 1, *Télécommandes PX5 , PX1 5, Inter 1* note : nombres et modèles "dossier permis de construire" - 10u				
4	Portes extérieurs : (fourniture) anthracite	1 ENS	1 500,00 €	20 %	1 500,00 €
	"PACK" Portes EXT. ISO-thermo Porte d'entrée isolée 72-75 mm U 0,9 -1,1« ACCIER/ALU/BOIS »PASSIVE HAUSE 90" 102x210 KMT ou MIKEA				
5	Portes intérieures : (fourniture)	1 ENS	1 800,00 €	20 %	1 800,00 €
	"PACK" Portes INT. ISO-phonique Blocks portes 70/80, portes pleins, avec le joint Iso- Phonique, l'épaisseur réglable, coloris au choix (6x80, 1x70)				
6	Electricité : "KIT fourniture"	1 ENS	3 500,00 €	20 %	3 500,00 €
	"KIT" Kit électricité NF Kit« prête à poser » La norme C15-100 (passage : faux-plafond) Appareillage (prises, interrupteurs) - SCHNEIDER (Odace, plaques blanches, beige ou gris) LEGRAND : Tableau d'abonné/inter - différentiels / disjoncteurs / parafoudre Coffret courant faible / prise de terre Les pieuvres et éléments repérés et numérotés R.D.C. - ENTREE - Finition SCHNEIDER Point lumineux (int. ext.) Va-et-vient et ou Simple allumage Prise de courant 16A R.D.C. - BUANDERIE - Finition SCHNEIDER Alim. Spots (max 5 spots/alim.) Simple allumage Prise de courant 16A Alimentation Chauffe-eau Alimentation VMC / BATERIE Prise spécialisée				

N°	Désignation	Qté	PU HT	TVA	Total HT
	LL				
	1 Alimentation PAC Air-Eau ou Air-Air (option)				
	R.D.C. - CUISINE - Finition SCHNEIDER				
	Alim. Spots (max 5 spots/alim.) Simple allumage (ou va-et-vient)				
	7 Prises de courant 16A				
	1 Sortie de câble 32A				
	2 Prises spécialisées				
	1 Alimentation Hotte				
	CUISSON FOUR LV				
	R.D.C. - SALON SAM - Finition SCHNEIDER - Ovalis				
	Simple allumage				
	Va-et-vient (inclus les 2 interrupteurs)				
	1 Point Lumineux ext.				
	1 Alim. Spots (max 5 spots/alim.) commandé par :				
	8 Prises de courant 16A				
	2 Prises RJ45 (tél et/ou réseau 100Mbps)				
	1 Prise TV				
	R.D.C. - TERRASSE/s - Finition SCHNEIDER - Mureva saillie/encastre - Passage par : Faux-Plafond/mur				
	1 Prise de courant 16A				
	2 Sortie aplique				
	R.D.C. - COULOIR - Finition SCHNEIDER				
	1 Alim. Spots (max 5 spots/alim.)				
	1 Va-et-vient (inclus les 2 interrupteurs)				
	Prise/s de courant 16A				
	R.D.C. - SDB - Finition SCHNEIDER				
	1 Alim. Spots (max 5 spots/alim.)				
	1 Simple allumage				
	3 Prises de courant 16A				
	2 Liaisons équipotentielles (□ baignoire ou □ douche, nous préciser SVP)				
	1 Alim. convecteur ou sèche-serviettes ou Plancher Rayonnant Electrique				
	ou 1 Alim.sèche-serviettes				
	R.D.C. - CHAMBRES - Finition SCHNEIDER				
	2 Appliques (selon le choix, chambre parentale)				
	1 Alim. Spots (max 5 spots/alim.)				
	2 Simples allumage ou 1 Va et vient				
	4 Prises de courant 16A				
	1 Prise RJ45 (tél et/ou réseau 100Mbps)				
	R.D.C. - DIVERS - Finition SCHNEIDER				
	Alims Volets Roulants 8				

N°	Designation	Qté	PU HT	TVA	Total HT
	R.D.C. - CELLIER - Finition SCHNEIDER Point lumineux central, Simple allumage 1 Prise de courant 16A R.D.C. - WC - Finition SCHNEIDER 1 Alim. Spots (max 5 spots/alim.) 1 Simple allumage				
7	Plomberie : "KIT fourniture"	1 ENS	1 350,00 €	20 %	1 350,00 €
	"KIT" Kit plomberie PER (option multicouche) KIT« prête à poser » DTU tubes PER (passage : faux-plafond) Collecteur sanitaire complet pré-monté Vannes 1/4 de tour/réducteur de pression / raccords / pince coupe-tube Note * Installations ne comprennent pas les évacuations Kit plomberie « prêt à poser » DTU tubes PER (passage : faux-plafond) Collecteur sanitaire complet pré-monté Vannes 1/4 de tour/réducteur de pression/raccords/pince coupe-tube Note * Installations ne comprennent pas les évacuations Fourniture PLOMBERIE - version PER Gainé Extérieur pour Robinet Extérieur Point eau froide extérieur, Ø13/16 PER gainé, avec purge, robinet extérieur et patère de fixation type traversée de mur. Cellier / Buanderie pour Cumulus Points eau froide & chaude Ø16/20 PER gainé pour Lave-Linge Point eau froide Ø10/12 PER gainé pour LL/LV incluant 1patère et 1 robinet mural Cuisine pour Evier Points eau froide & chaude Ø10/12 PER gainé pour Lave-Vaisselle Point eau froide Ø10/12 PER gainé pour LL/LV incluant 1 patère et 1 robinet mural W.C. pour Cuvette W.C. Point eau froide Ø10/12 PER gainé Platine support simple pour PER 10/12 - ensemble d'encastrement mural d'arrivée d'eau. pour Lave-Mains Points eau froide & chaude Ø10/12 PER gainé Salle de Bains pour Baignoire Points eau froide & chaude Ø13/16 PER gainé Platine support double entraxe 150mm pour PER 13/16 - ensemble d'encastrement mural des arrivées d'eau froide et chaude pour Vasque double				

N°	Désignation	Qté	PU HT	TVA	Total HT
	Points eau froide & chaude Ø10/12 PER gainé doubles, avec té et raccords pour Douche (option) Points eau froide & chaude Ø13/16 PER gainé Platine support double entraxe 150mm pour PER 13/16 - ensemble d'encastrement mural des arrivées d'eau froide et chaude Pince coupe-tube D12 à 40mm Collecteur sanitaire complet prémonté (support mural, nourrices à vannes 1/4 de tour pour chaque départ, vanne d'arrêt général, réducteur de pression, raccord pour tube PE Ø25mm (dispo également pour PE Ø20 et Ø32, nous préciser si besoin)) NOTE : il est prévu dans notre installation le raccordement direct sur notre collecteur du plymouth d'arrivée générale d'eau du réseau. Il n'y a donc, en standard, pas de liaison prévue entre cette arrivée d'eau et l'emplacement du collecteur sanitaire. Total du kit plomberie PER - Raccords à compression Votre devis a été chiffré avec des patères de fixation pour les cuvettes de WC, les douches et les baignoires. Sur demande de votre part, elles peuvent être fournis sur les autres arrivées d'eau. N'hésitez pas à nous consulter.				
8	Couverture : "PACK fourniture TOIT PLAT"	1 ENS	3 000,00 €	20 %	3 000,00 €
	"PACK" Couverture/Toit 2° (pack toiture, toit plat 2°) :isolation sur-mesure, façonnée en ponte à 2°, livrés avec le plan de montage Isolation graphitée à emboîtement simple Couche d'étanchéité N°1 (auto - collante + fixations) Couche d'étanchéités N°2 (colle a froid, livrée avec le kit) Boite/s a eau GALECO, pièces en zinc + fixations (zinc 40x200 cm) Plaques OSB 22 MM "HYDRO 60/120X240" Fixation + plan de pose				
9	ECS - Ballon d'eau chaude thermodynamique AVEC pompe à chaleur "PACK fourniture"	1 u	1 590,00 €	20 %	1 590,00 €
	Chauffe-eau thermodynamique monobloc **Altech Concerto 200L CEDEO Saint gobain** (sur demande 250L) avec adaptateur 160/180 mm classe énergétique A+ Réf HP200M3A Description Grâce à sa pompe à chaleur intégrée, le chauffe-eau thermodynamique Altech récupère les calories naturellement présentes dans l'air de votre habitat ou sur l'air extérieur pour produire de l'eau chaude sanitaire en abondance. Contrôle de commande intuitive offrant 5 modes d'utilisation Gamme CONCERTO Classe d'efficacité énergétique (mode eau chaude sanitaire ECS) A+ Consommation énergie par an kWh/an 807 Groupe de sécurité, siphon, isolant tube 20/25 (max 10m), raccords				
10	PACK 3en1 Chauffage / Climatisation / VMC Double-flux (Fourniture)	1 ENS	6 865,00 €	20 %	6 865,00 €

N°	Désignation	Qté	PU HT	TVA	Total HT
	OPTION "3en1" / RE2020 (option à associer avec plancher BOIS-ISO ou ISO2000) **VMC + Chauffage + CLIM / Rafraîchissement** **« Installation complète »** - VMC thermodynamique 3 en 1 **pour ventiler, chauffer et refroidir** votre logement **Confort** optimal **365 jours/an, la maison saine, sans bactéries, fraîche en l'été et chaude en l'hiver.** *VMC avec une pompe à chaleur intégré * NILAN France : Combi 302 Polar Top est un appareil de ventilation, chauffage, rafraîchissement, qui allie deux technologies de récupération de la chaleur. La récupération passive est assurée via un échangeur à contre-courant qui exploite entre 85 et 95 % de l'énergie pré- sente dans l'air extrait. La récupération active se fait grâce à une pompe à chaleur qui exploite l'énergie résiduelle. La pompe à chaleur, avec COP supérieur à 4, permet de se passer d'une batterie de chauffe quelque soit la saison (option offerte par BoisKitEco). Combi 302 Polar Top peut augmenter la température de l'air soufflé de plus de 30 °C. Combi 302 Polar Top est livré avec une batterie de préchauffage intégré pour la protection antigel de l'échangeur contre courant. Cela garantit un fonctionnement en continu à basses températures extérieures. Fonctionnement : -20/+40 °C Classe énergétique : A+ SCOP : 4,01 - 5,00				
11	Dalle ISO2000 "PACK fourniture" **"VARIANTE 2" dalle béton** (fournitures sous la dalle, hors béton) **OPTION "ISO2000" RTe2020** BETON / plancher RDC / Plancher béton 24+20 cm : - Plaques ISO2000 à emboîtement 240 MM (sous la dalle) - Film de pare-vapeur 200 microns = 0.2/0.5 mm - Plaques ISO2000 à emboîtement 120 MM (pour fabriquer, une rehausse autour) - Treillis soudé 8 mm panneaux 1,20 x 2,40 m - Cale, support (treillis) boite 100u - Un trottoir périphérique en béton 6X20X100 CM (pour faire le tour de l'habitation) - Film géotextile pour stabiliser le terrain (trottoir) - Plan de pose, plans sanitaires, fondations Note : 20 cm du béton a prévoir, sous la maison la surface filtrante de 20 à 30 cm (graviers, tout-venant, sable) Livraison 1 bis, réceptionné par le client, idem pour le déchargement, temps de préparation 3-4 semaines Conseil BoisKitÉco : a prévoir les graviers calcaires 0-35 autobloquants pour mettre autour de la maison (ep. 10 cm, largeur 80-100 cm)	136 m²	56,00 €	20 %	7 616,00 €
12	Transporte (montage et déchargement par le client) : télescopique à prévoir (type manitou 2T, 3-4 heures) Note* 2-eme livraison, maximum 3 -4 semaines après (livraison N°1).	2 u	0,00 €	20 %	0,00 €

N°	Désignation	Qté	PU HT	TVA	Total HT
	Note * BOIS : Bois massif / KVH classe C24 / CE (PINS / ÉPICÉA) Note* SURFACES : MURS : 415 MM R=10,27 / 0,033 W/mK * U = 0,097 façades - 136 m2 (enduit 100, bardage 36) cloisons - 104 m2 plancher - 120 m2 (plafond) charpentes 2° - 125 m2 Note * RT : (2012/2020) ISOLATIONS (ITB-0851/W - CE: 1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P): Matériau MURS : **laine de roche 150MM** + Polystyrène graphité 200MM + FILM (PV 0,2) Epaisseur (cm) 35 Conductivité λ(W/m.K) 0,033 Résistance R (m²K/W) 10,27 Transmission U 0,097 (W/m²K) 0,0300 Δ U "laine de roche" MEGAROCK ROCKWOOL Matériau TOITURE : **laine de roche 200MM + 50MM**+ FILM (PV 0,2) + Polystyrène graphité 20-150MM + FILM (PV 0,2) Epaisseur (cm) 35 Conductivité λ(W/m.K) 0,036 Résistance R (m²K/W) 8,40 Transmission U 0,128 (W/m²K) 0,0300 Δ U "laine de roche" MEGAROCK ROCKWOOL				
13	PACK Isolations : "PACK fourniture", murs et toiture" LAINE DE ROCHE" λ D = 0,034-37 W/mK 0,28 kN/m³ ClasseA1 HK/B/0439/01/2011 Masse 28 kg/m3 rouleaux ou plaques 100 cm Isolation phonique 45/50 mm - cloisons Laine de roche ROCKWOOL / ROCKMIN 15 CM 3,66B Laine de roche ROCKWOOL / UNIROCK 5 CM 10,98B Laine de roche ROCKWOOL / ROCKMIN 20 CM 3,05B	1 ENS	2 750,00 €	20 %	2 750,00 €
14	OFFRE COMERCIALE : **OFFRE - (offerts par BoisKitEco) :** **1*PEINTURE BLANCHE ÉCOLOGIQUE, ACRYLIQUE "ECO PRO"** **(10L/100M2 X 6)** **2*PLAQUES BA 13 mm 120X260 cm (302,64 M2)** **3*APPUIS DE FENÊTRES ALU (ext.) - COMPOSITE PVC (int.)** **4*APPUIS ISO8000** **5*Petites outillages, meches et embouts** **6*Location : outils a batteries louées gratuitement,** pour le montage de GROS-OEUVRES Note * sous condition d'achat "la maison + options"	1 ENS	0,00 €	20 %	0,00 €

Sous-total HT	**76 021,00 €**
Remise exceptionnelle	- 2 500,00 €
Total HT	**73 521,00 €**
TVA à 20 %	14 704,20 €
Total TTC	**88 225,20 €**

Paiement par chèque ou par virement bancaire.

Calendrier et modalités de paiement : 25% à la commande + 25 % à la commande (J-15 Options) + 22,5 % à la livraison n°1 (J-15) + 22,5% à la livraison n°2 (J-15) + 5% à la livraison (J-15)

Virement : SARL TONEK / RIB: 18707 00066 31021827816 92
IBAN: FR76 1870 7000 6631 0218 2781 692 BIC: CCBPFRPPVER
BPVF ST JEAN DE BRAYE / 45800 SAINT JEAN DE BRAYE

Devis reçu avant la livraison, (CGV) Conditions Générales de Vente, disponible sur le site www.boiskiteco.fr

Le client
Mention manuscrite et datée :
« Bon pour accord. »

BoisKitEco

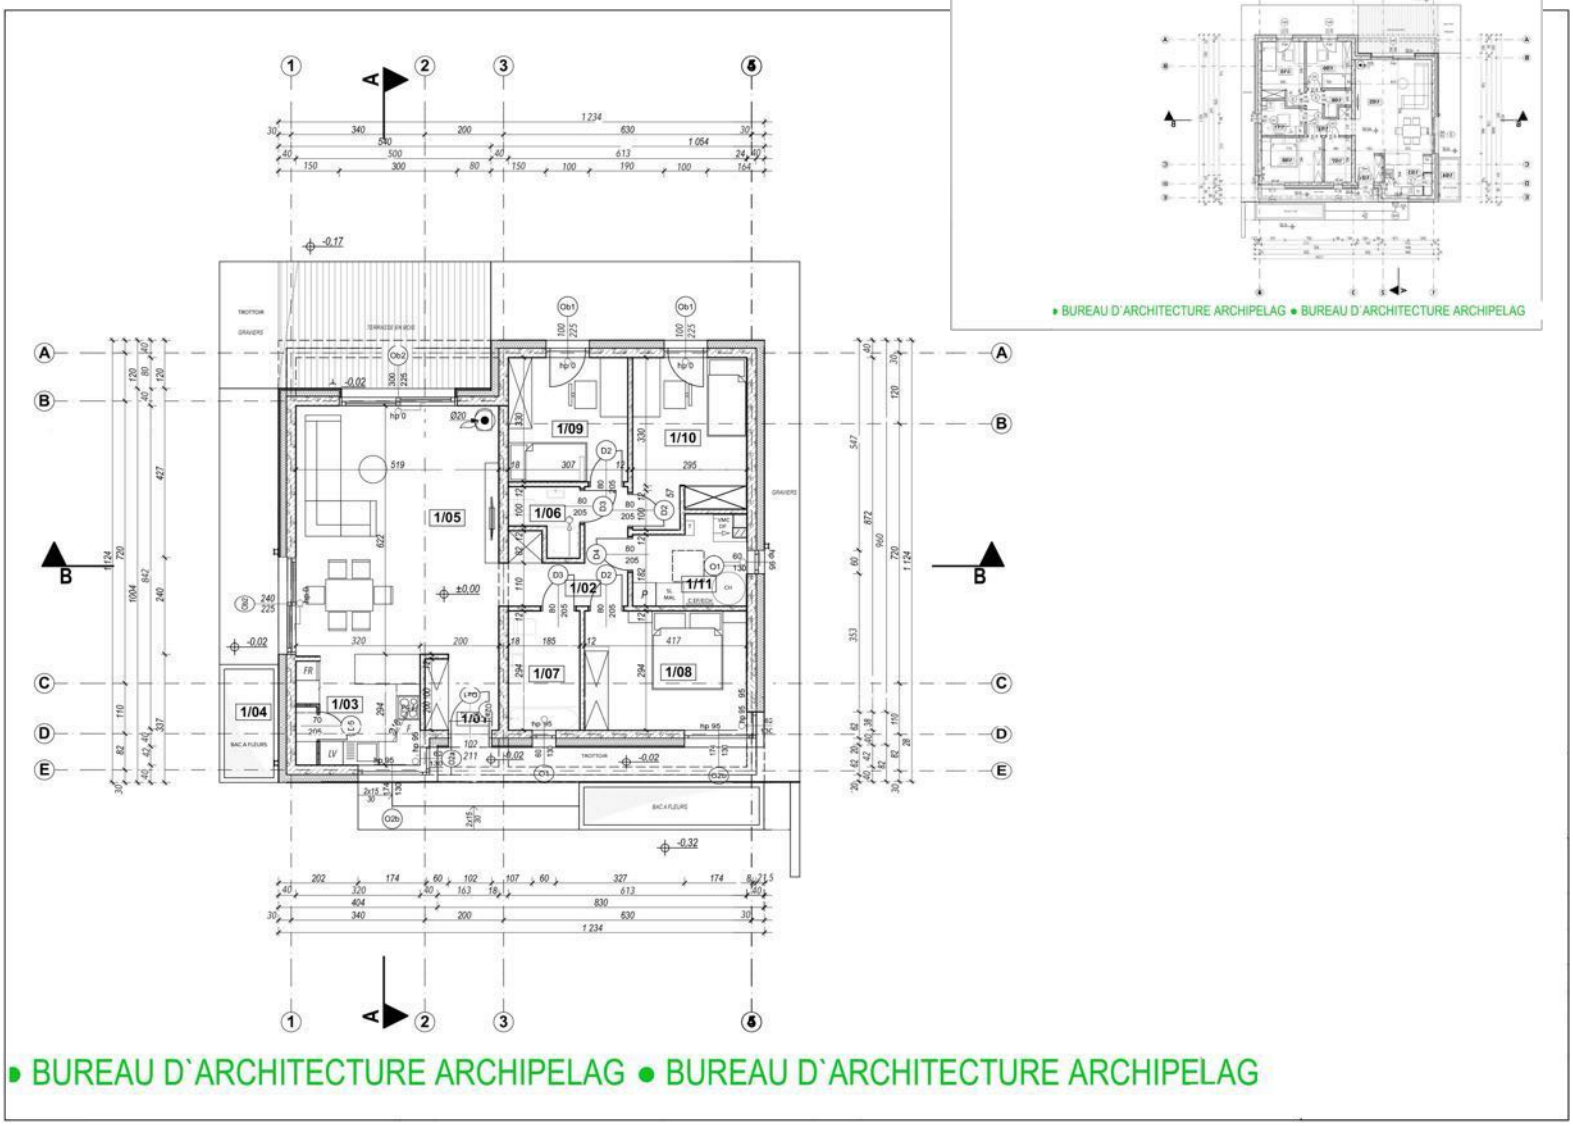

BoisKitEco
SARL TONEK
207 RUE DE HENRI TOULOUSE LAUTREC
45470 LOURY

R.C.S : ORLEANS 750 355 620

BoisKitÉco.Fr
Maisons Écologiques à Ossature Bois

PLAN

RDC: 95 - 102 M2

MINI 1 MODERN SG, 3 chambres, pièce de vie 42 m²

1. 2.93 m² 2. 8.59 m² 3. 7.83 m² 4. 0.79 m² 5. 28.71- 35,71 m²
6. 2.42 m² 7. 5.02 m² 8. 11.45 m² 9. 9.46 m² 10. 10.62 m² 11. 6.91 m²

EFFET MIROIR

0€

Coupe



Terrain min.

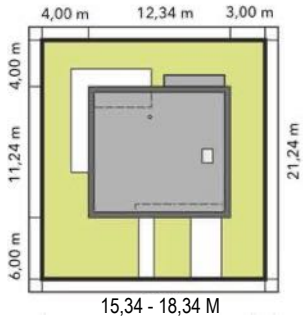

(D'autres versions sont disponibles, cherchez sur le site le modèle MINI 1 G1 MODERN)

MINI 1 MODERN 5CH

MINI 1 MODERN 4CH+G

MINI 1 G1 MODERN

Prix de 97 380€ (la maison avec toutes les options)

BoisKitEco « SARL TONEK » 207 rue de Henri Toulouse Lautrec 45470 LOURY - Tél. : 02 38 21 71 22 - Email : contact@boiskiteco.fr - www.boiskiteco.fr

Montage en auto-construction délai indicatif, pour 3-4 personnes , uniquement l'ossature bois

BoisKitEco « SARL TONEK » 207 rue de Henri Toulouse Lautrec 45470 LOURY - Tél. : 02 38 21 71 22 - Email : contact@boiskiteco.fr - www.boiskiteco.fr

1

PACK Couverture de toit plat

inclus dans le prix

2

PACK Porte/s

inclus dans le prix

3

PACK Fenêtres

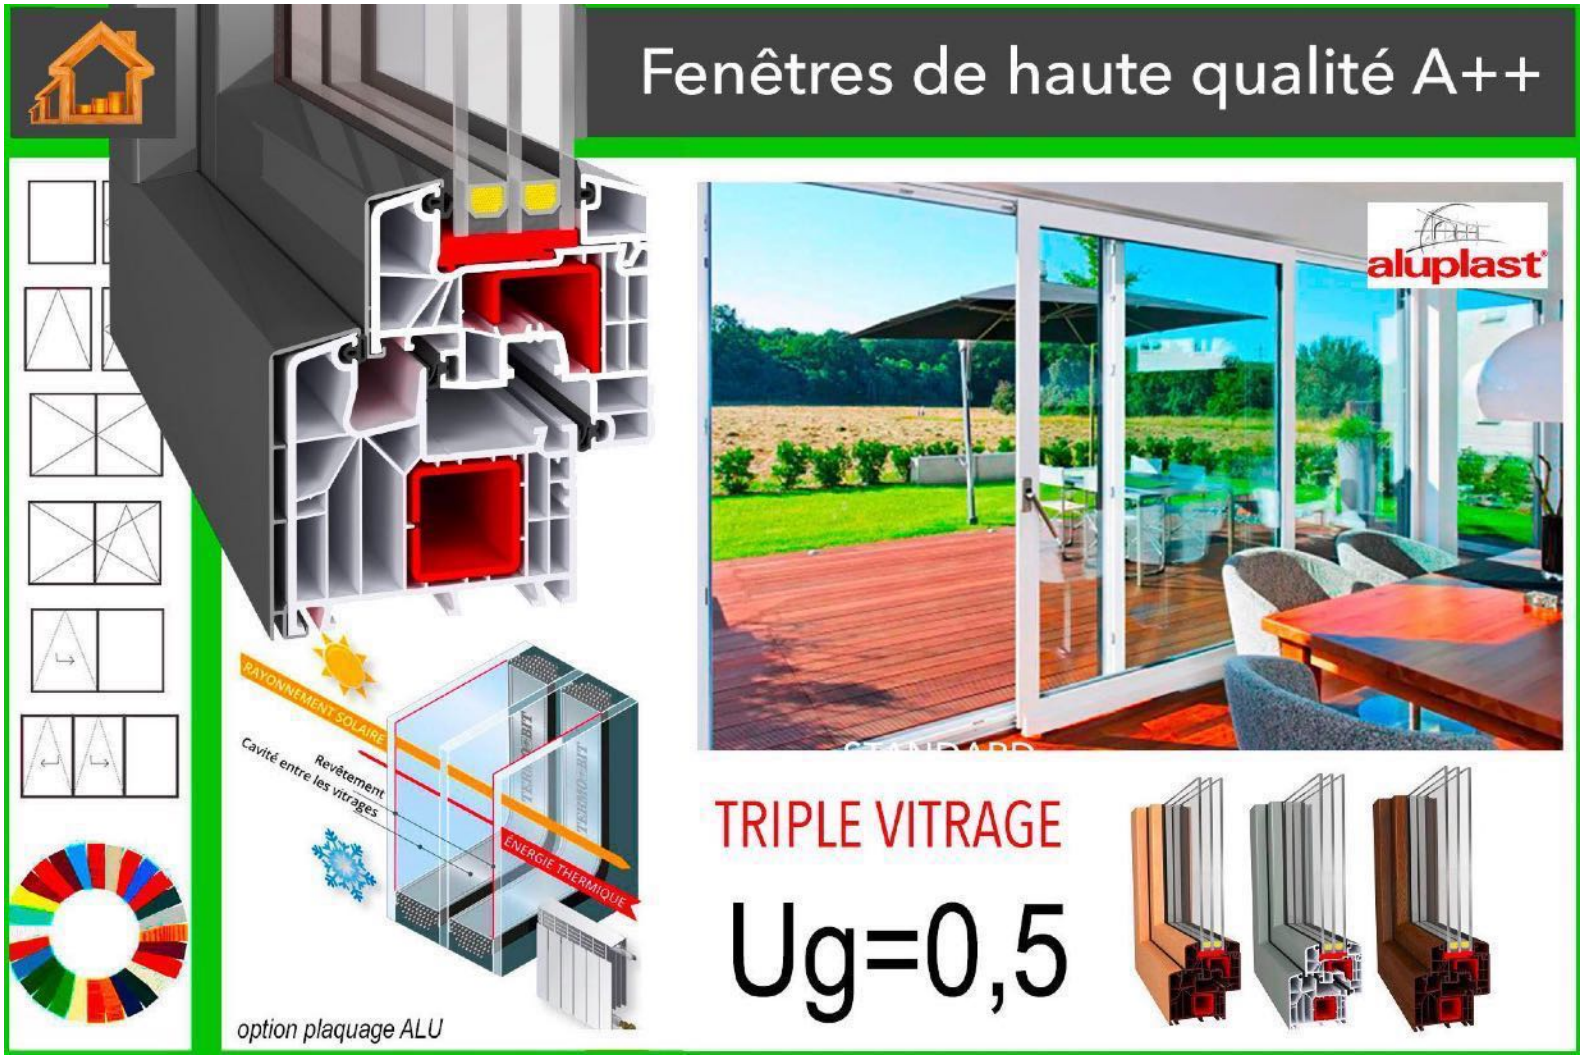

inclus dans le prix

PACK Volets

inclus dans le prix

KIT Plomberie

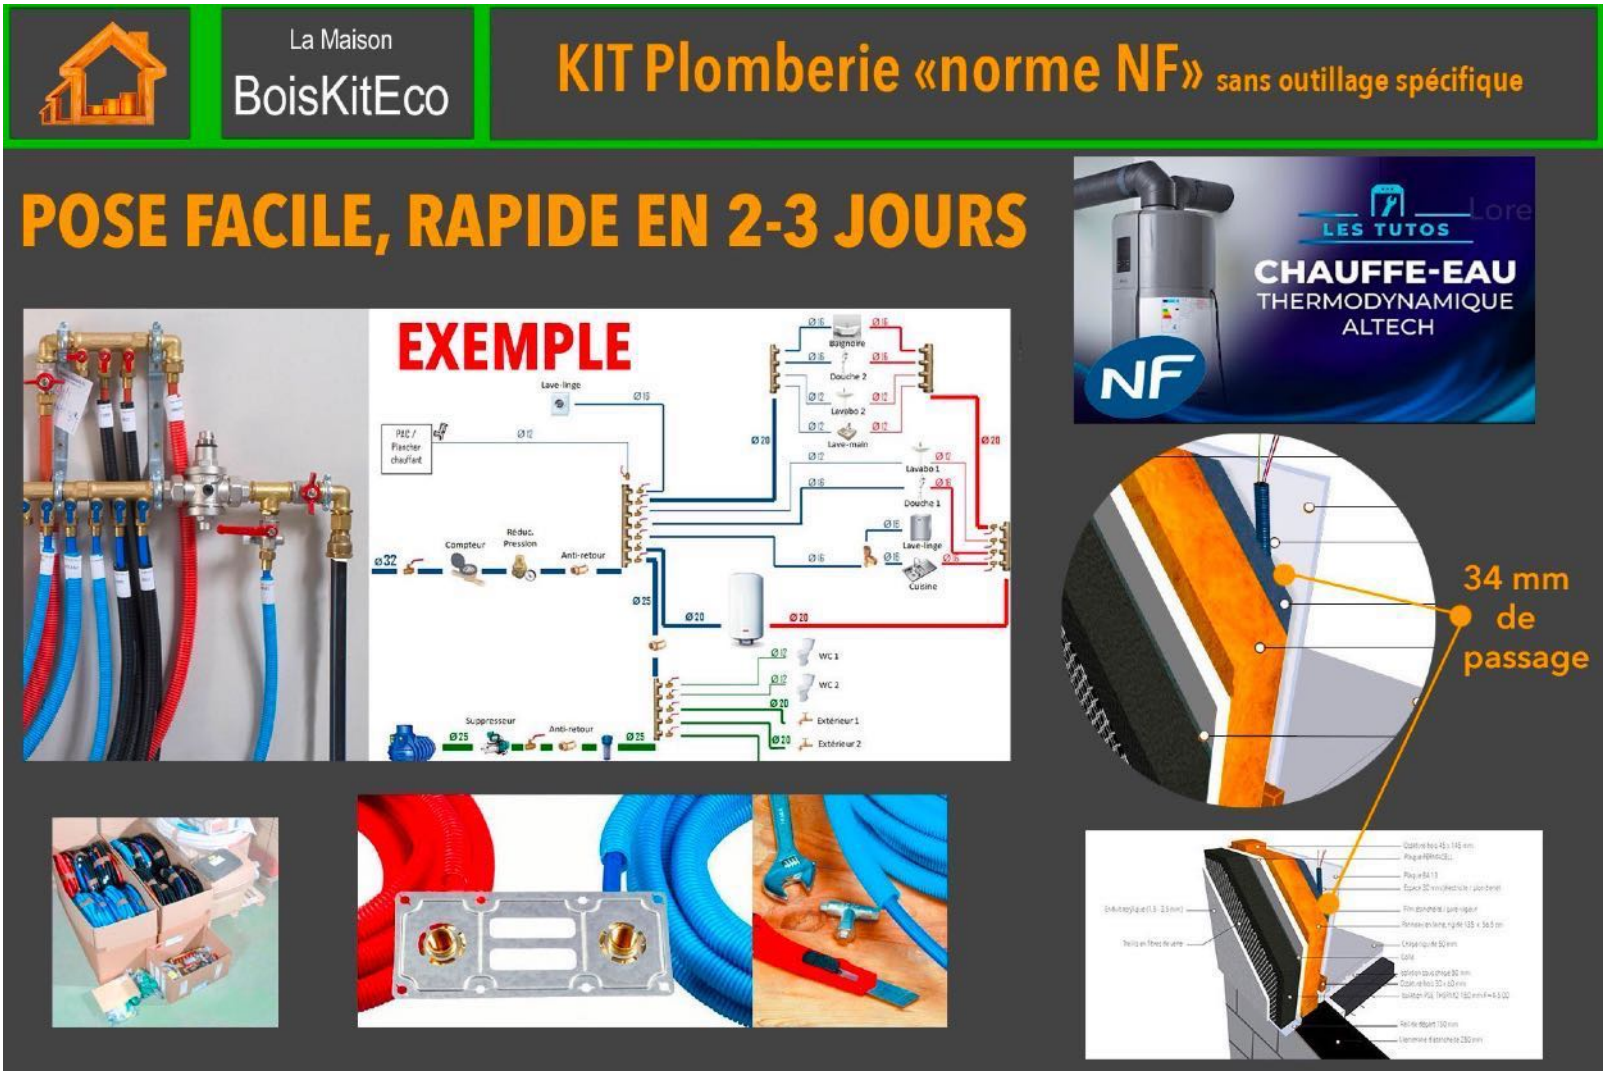

inclus dans le prix

KIT Électricite

inclus dans le prix

PACK Isolations

inclus dans le prix

PACK Portes

inclus dans le prix

9a

HASSLACHER NORICA TIMBER

PACK pour Dalle béton

option

9b

Termo Organika

PACK pour Dalle bois

option

1

PACK Chauffage + Clim + VMC

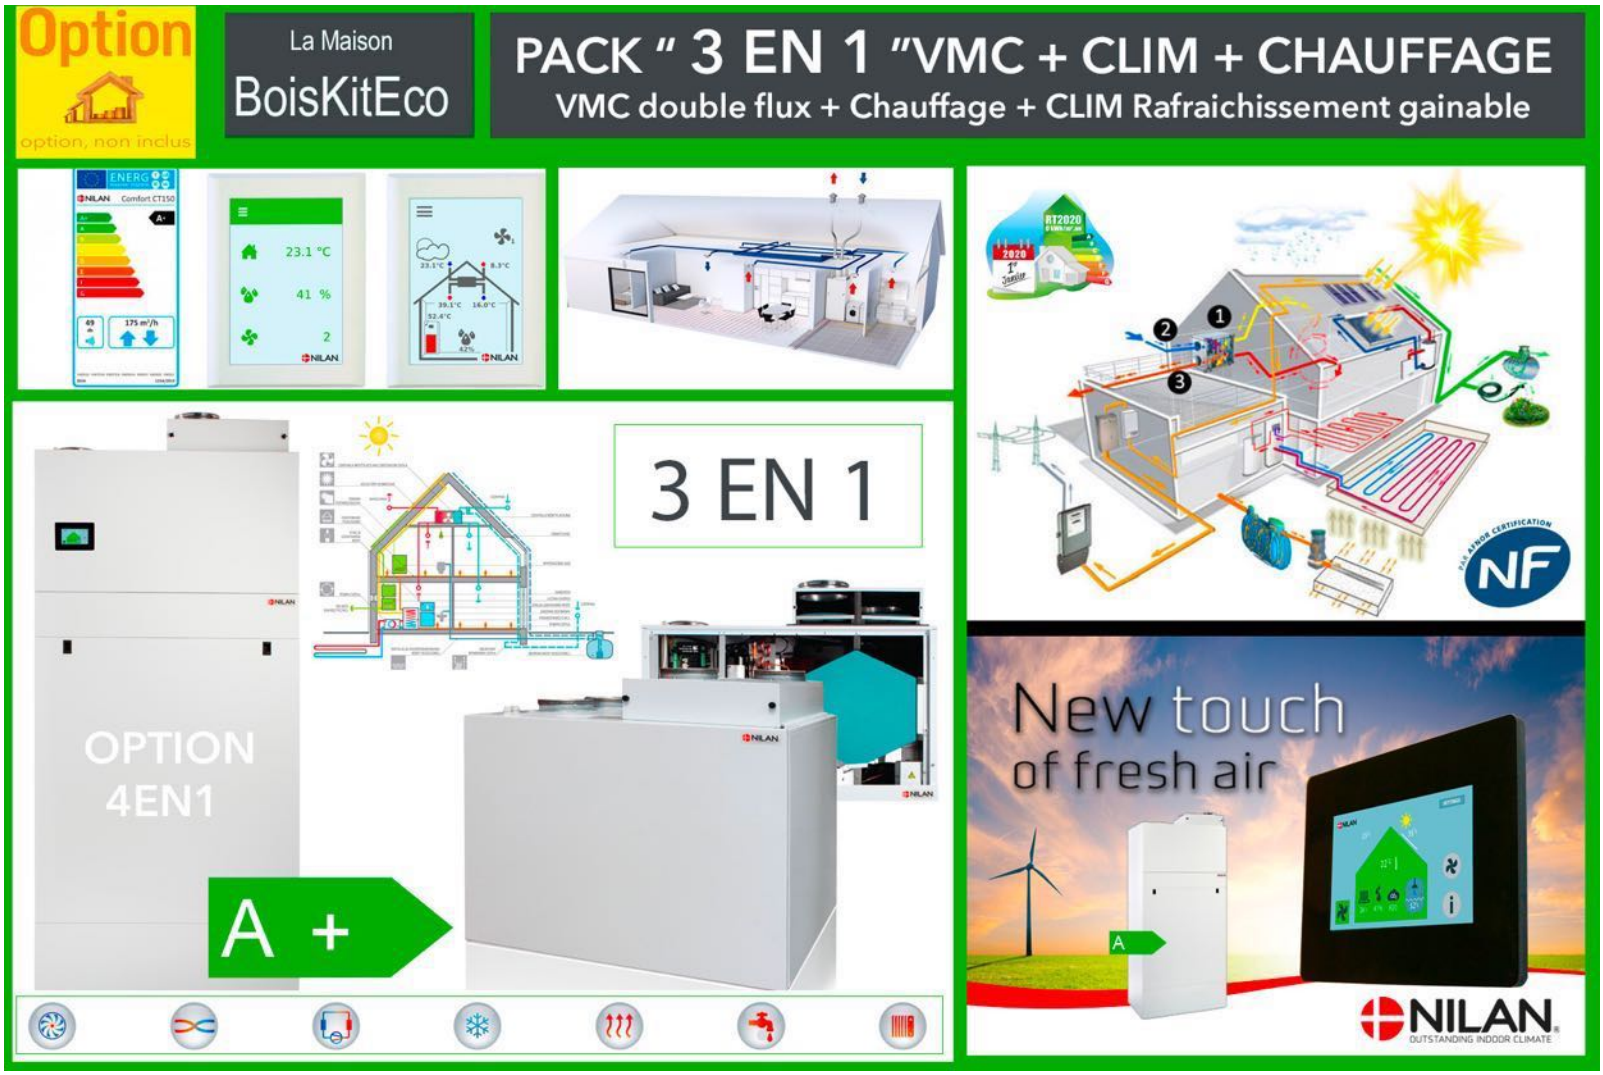

option

Offerts

offre (0,00€)

Offerts

offre (0,00€)

Offerts

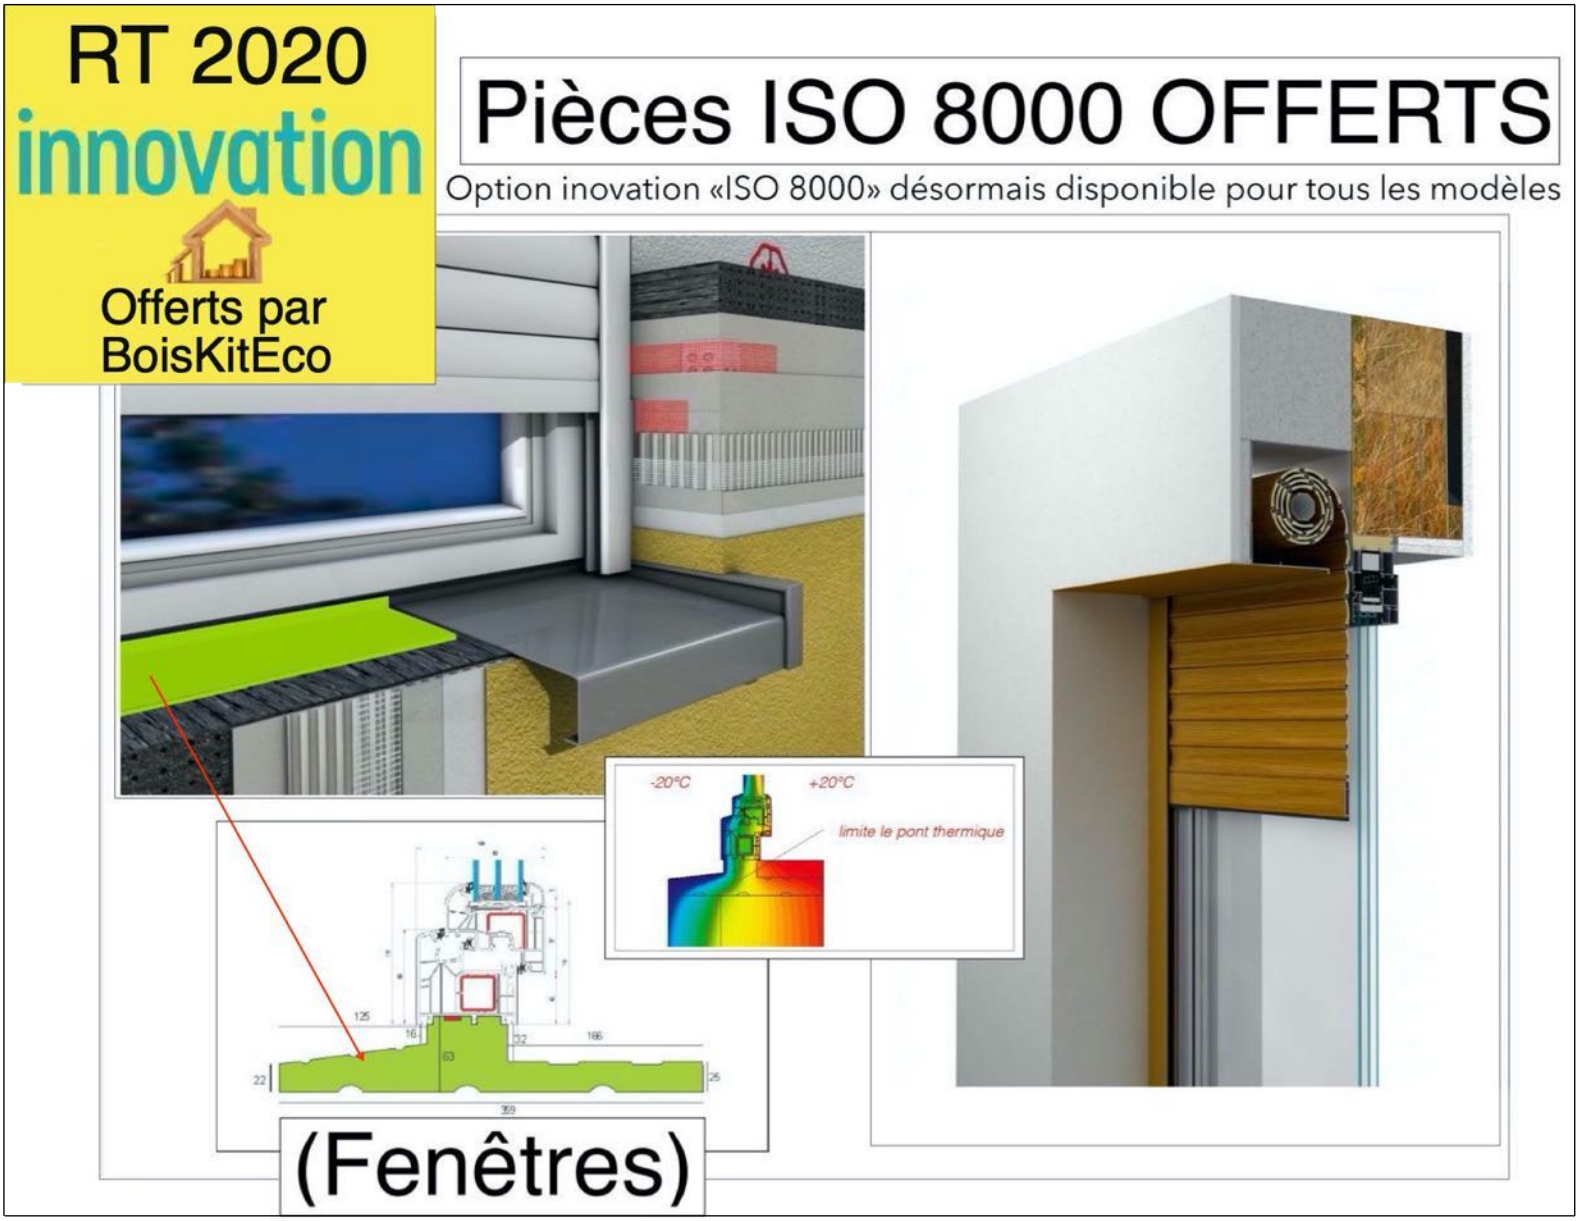

offre (0,00€)

Offerts & Empruntés

offre & location (0,00€)

SOMMAIRE

La Maison
BoisKitEco

LES 6 POINTS INCONTOURNABLES POUR BIEN GÉRER UN PROJET !

RÉSUMÉ

1* DOSSIER :
Permis de construire
+
Étude thermique RT

14-21 JOURS

2* FABRICATION :
La préfabrication
+
La livraison

45-90 JOURS

3* PRIX :
Le kit BoisKitEco
+
Les fournitures

UNE MAISON + OPTIONS

4* PAIEMENT :
Le permis de construire

100% EN LIGNE

La maison

SUR DEVIS EN 4-5 FOIS
(Signature - LOIRET (45)

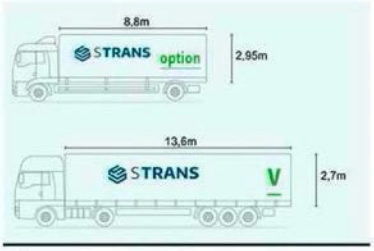

5* LIVRAISON :
Standard

CAMION 24 T / 13,60 M

Option

CAMION 10 T / 8,80 M

6* MONTAGE :

EN AUTO-CONSTRUCTION
(1 jour avec BoisKitEco)

Ou

PAR UNE ENTREPRISE LOCALE

(1* et 2*) jours ouvrés, selon nos disponibilités (3*) prix TTC, ossature bois, plus les fournitures (4*) en ligne par le CB, chèque ou virement, sur devis par chèque ou virement (5*) déchargement par le client, télescopique à prévoir (6*) le montage en présence d'un technicien BoisKitEco (1/2 journée la livraison N°1 + 1/2 journée la livraison N°2), une entreprise locale de votre choix, spécialisée dans les travaux de couverture, charpente et menuiserie

Fiche a envoyer pour toute demande, concernant le devis, étude de faisabilité.

A : Le : Signature :

modèle de maison :

……..

*Étude de faisabilité, devis pour la banque *

Fiche à envoyer par courrier à :

BoisKitEco - TONEK - 207 Rue de Henri Toulouse Lautrec - 45470 LOURY

Fiche de renseignements

PROJET : AUTO-CONSTRUCTION
(Pas de montage par BoisKitEco)

1 Coordonnées

Fiche à remplir en lettres majuscules

Nom :……
Prénom :……
Adresse :……
Code :…….. Ville :……..
Téléphone portable :
Tél. Fixe :……
Courriel :…… @……

2 Lieu de construction

Votre résidence principale… ☐ Votre projet locatif… ☐

Adresse : ……
Code : …… Ville :……
Réf. cadastrale :……la surface ……
Le début du chantier :……20……..
Terrain…☐ Promesse de vente…☐

3 Méthode/s

Construction :
100% auto-construction… ☐
Auto-construction + Entreprise locale (de votre choix)… ☐

Le financement :
Prêt immobilier. …..☐ Fonds propres …..☐ Les deux ….☐

(CGV) Conditions Générales de Vente, disponible sur le site www.boiskiteco.fr
BoisKitEco « SARL TONEK » 207 rue de Henri Toulouse Lautrec 45470 LOURY - Tél. : 02 38 21 71 22 - Email : contact@boiskiteco.fr - www.boiskiteco.fr

Fiche a envoyer pour toute demande, concernant le devis, étude de faisabilité.

Devis / Avant-projet

inclus dans le prix = inclus dans le prix sur le site

option = non inclus dans le prix sur le site

		Prix (TTC) :	"composez vous- même"
	1 : Couverture de toit plat bitume GALECO / MATIZOL de 5000€	inclus dans le prix	☐
	2 : PACK Porte d'entrée (service) EXT. ISO-thermo MIKEA / KMT BBC RE2020 de 1750€	inclus dans le prix	☐
	3 : PACK Fenêtres triple vitrage ALU-Plast A++ BBC RE2020 de 6500€	inclus dans le prix	☐
	4 : PACK Volets roulants ALU Portos RE2020 de 3250€	inclus dans le prix	☐
	5 : KIT Plomberie NF de 3350€	inclus dans le prix	☐
	6 : KIT Électricité NF de 3990€	inclus dans le prix	☐
	7 : PACK Isolations (par intérieur et par l'extérieur) BBC RE2020 de 6000€	inclus dans le prix	☐
	8 : PACK Portes int. ISO-PHONIQUE de 1800€	inclus dans le prix	☐
Variante 1	9 : Dalle / plancher béton ISO 2000 PASSIVE HOUSE RE2020 de 77€/m2	option	☐
Variente 2	9b : Dalle / plancher bois ISOBOIS RE2020 de 87€/m2	option	☐
	10 : PACK 3EN1 Chauffage + Clim + VMC « CONFORT 365 JOURS » NILAN FRANCE RE2020 7 900€	option	☐
	Autres demandes (version avec garage ou une version adaptée) :		☐

A completer :
*béton, graviers, sable …
*gaine EDF, Tel., PVC canalisation
*sols, faïence, deco
*cuisine, salle de bain

NOTE BoisKitEco :
Dans un premier temps, des devis sont réalisés pour les clients qui ont commandé le dossier « permis de construire ».
Pour les autres clients, nous le faisons uniquement sur notre temps libre, et uniquement si nous pensons que la mise en œuvre est possible.
Par conséquent, il est important que vous remplissiez correctement le formulaire, en saisissant autant d'informations que possible.

(CGV) Conditions Générales de Vente, disponible sur le site www.boiskiteco.fr
BoisKitEco « SARL TONEK » 207 rue de Henri Toulouse Lautrec 45470 LOURY - Tél. : 02 38 21 71 22 - Email : contact@boiskiteco.fr - www.boiskiteco.fr
